

第一高校長寿命化改修（第一期）工事

2024年7月号

# 竹内・坂口JV NEWS! Vol.9



## 竹内・坂口建設工事共同企業体

株式会社竹内工務店  
〒862-0913  
熊本市東区尾ノ上4-20-11  
TEL 096-365-3366



坂口建設株式会社  
〒862-0956  
熊本市中央区水前寺公園28-43  
TEL 096-383-3131





## ～屋上防水工事～


5月末より、屋上の防水工事を行っています。今回の工事は、屋根保護防水密着断熱工法となります。6月は絶縁クロス張りまで行いました。下記は、工事のおおまかな流れになります。



①不陸調整モルタル打設  
解体後のデコボコした部分を平滑にします。



②含水率の確認  
下地が乾燥していることを確認します。

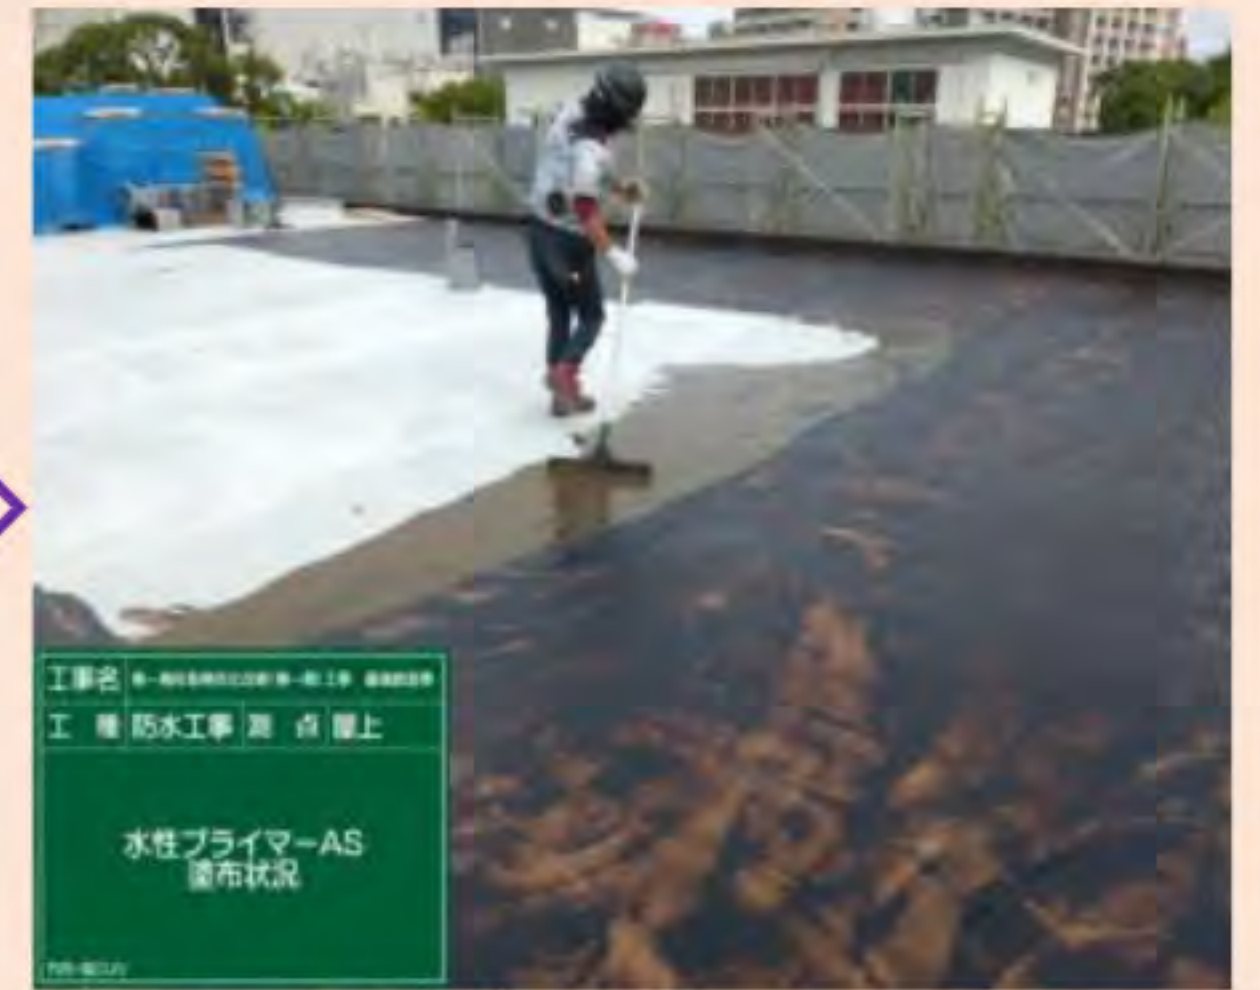

③プライマー塗布  
清掃確認後、プライマーを均一に塗布します。




④改質アスファルトルーフィング張り  
剥離紙をはがしながら、しわが入らないように貼り付けていきます。



⑤アスファルト溶融  
アスファルトを溶かし、260℃程度にします。



⑥ストレッチルーフィング張り  
溶かしたアスファルトを流しながら、しわ・気泡が生じないように張りつけます。

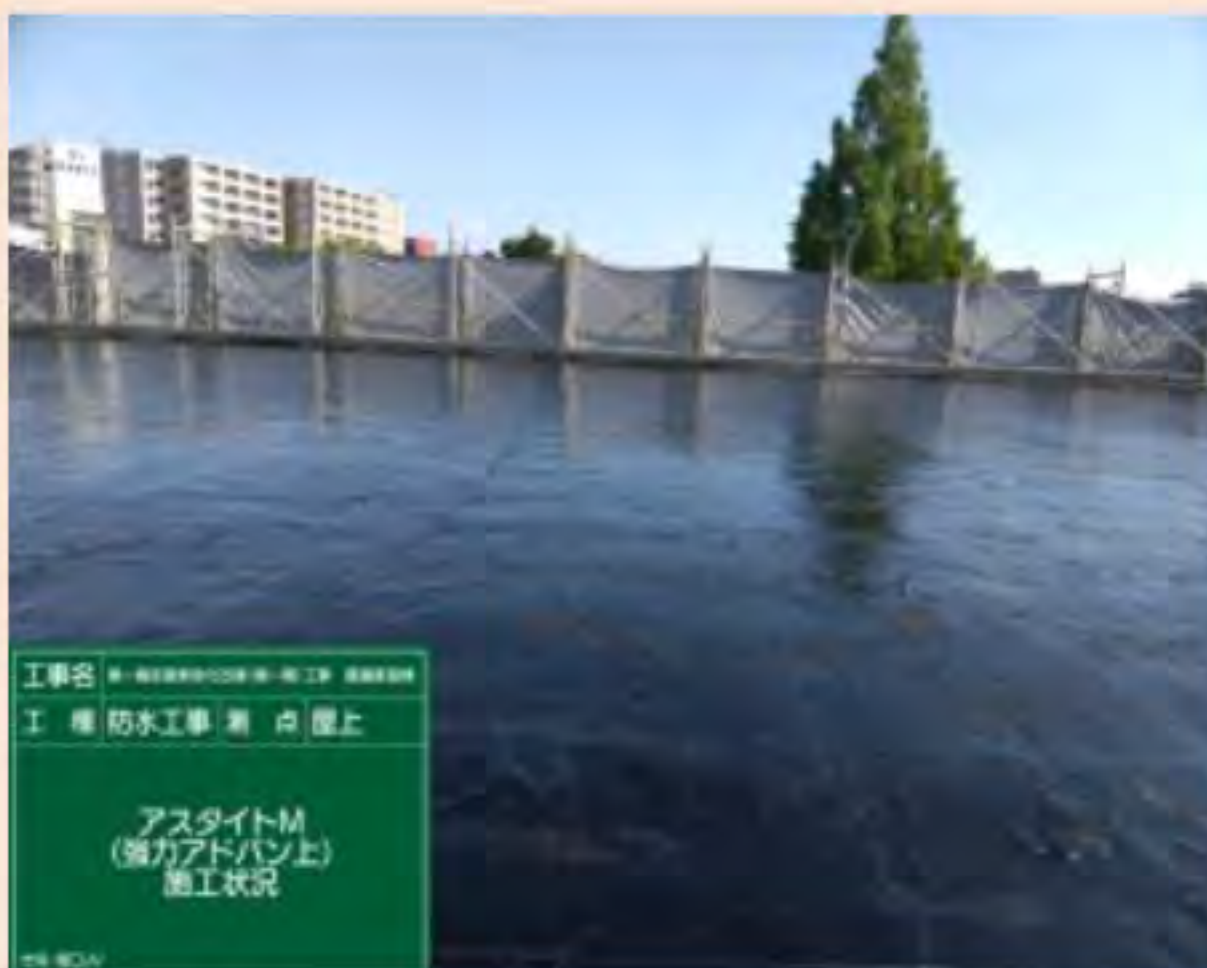


⑦アスファルト塗布  
アスファルトを規定量塗布します。



⑧断熱材の施工  
アスファルトにて断熱材（厚さ4センチ）を張り付けます。



⑨絶縁クロス張り  
アスファルトで絶縁クロスを点張りします。

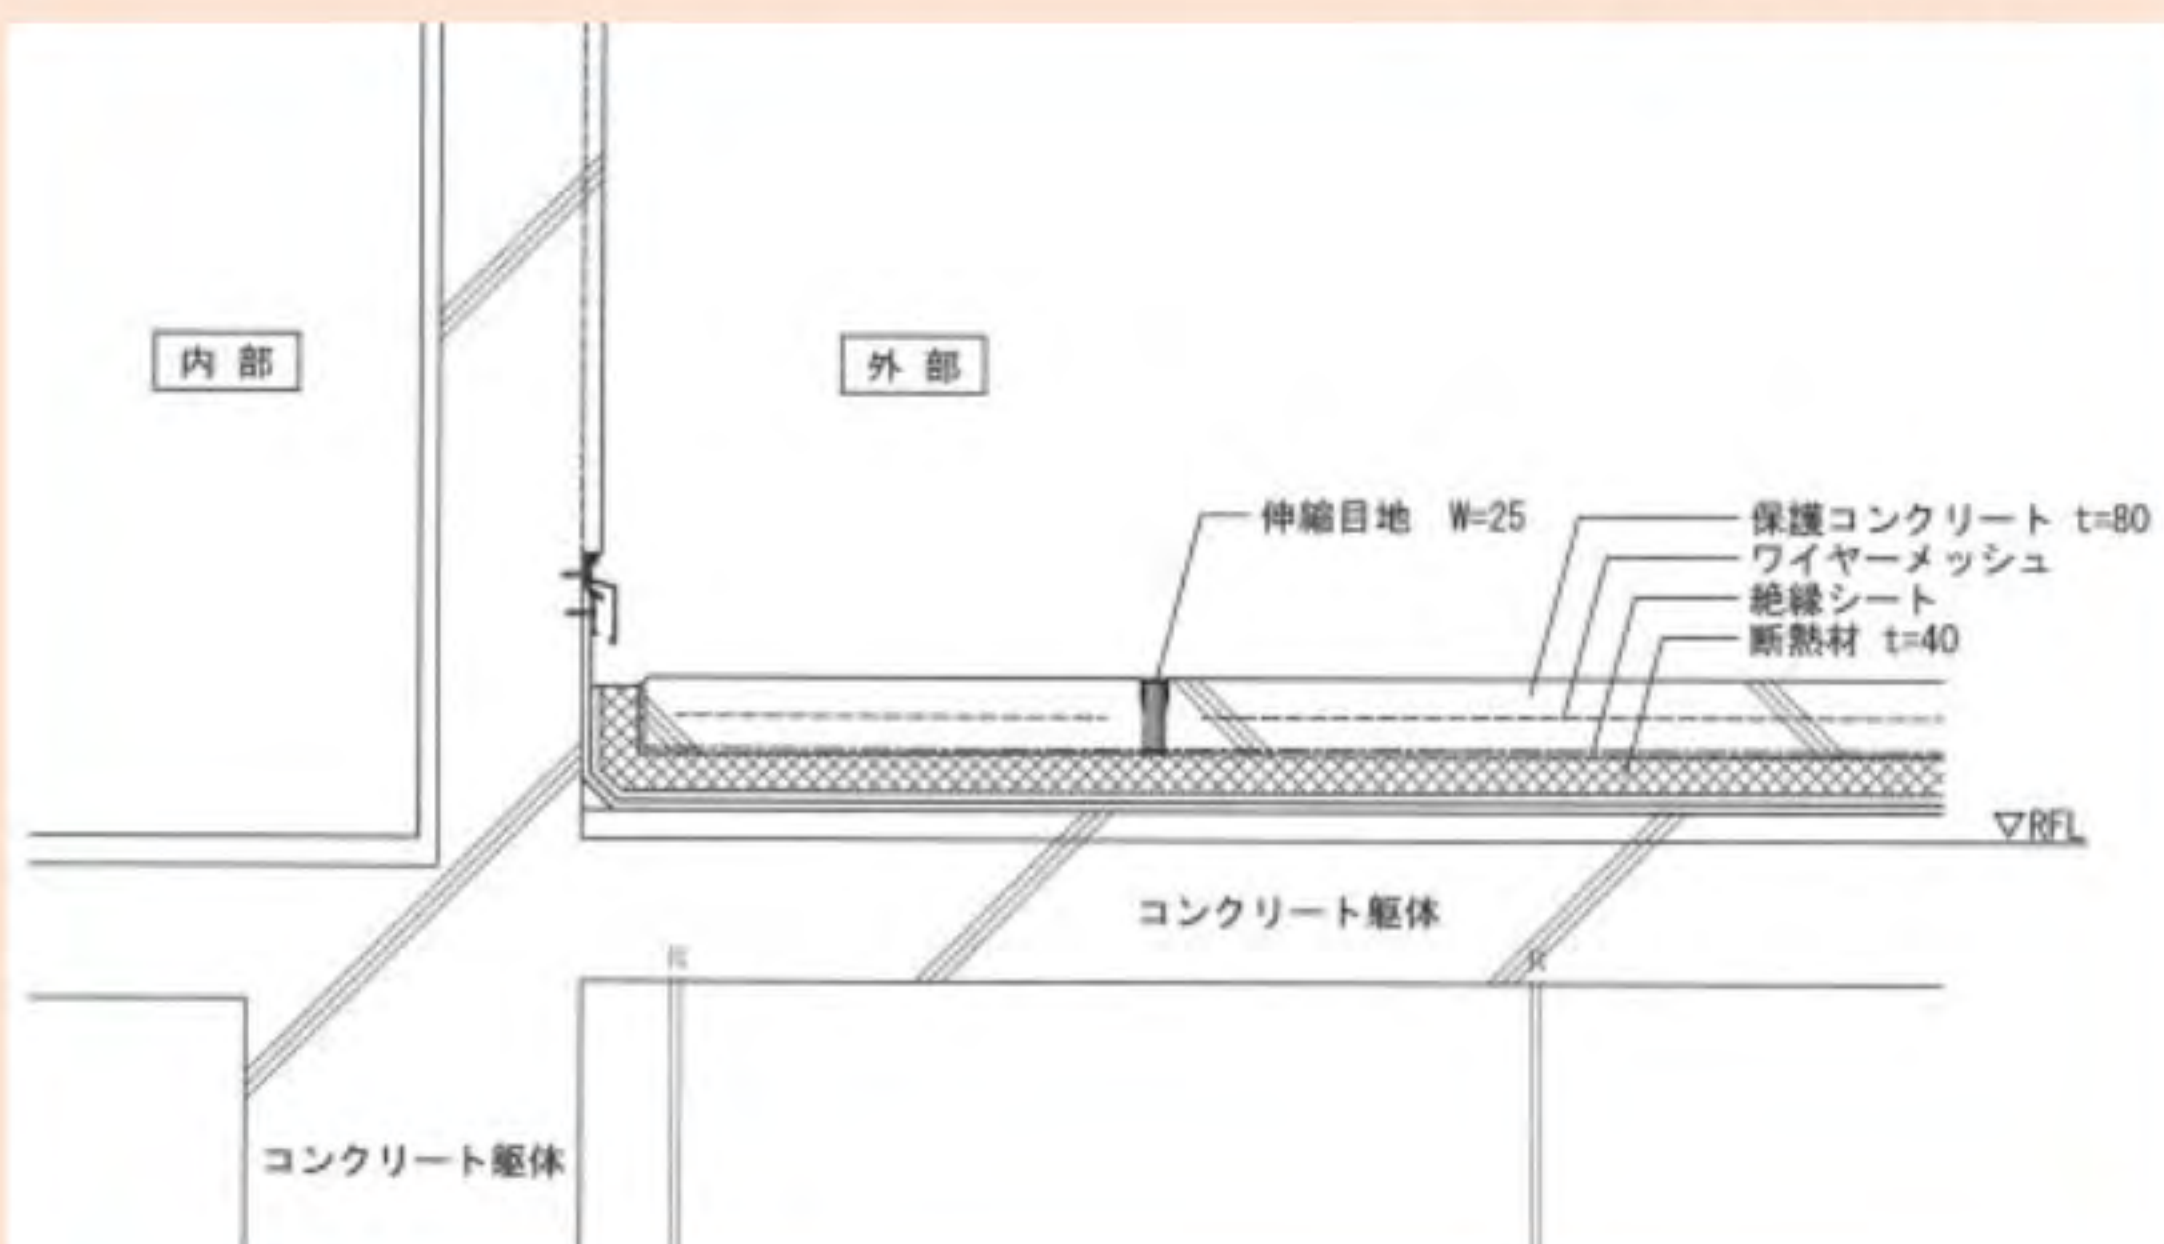

炎天下のとても暑い中、260℃のアスファルトを使用して作業されている防水工事の職人さん方には、頭が下がる思いです。

7・8月は伸縮目地材（幅2.5センチ・高さ8センチ）の取付、保護コンクリートの打設を予定しています。

左の図は、屋上部分の断面詳細図です。

防水工事：(有)孝栄防水【誠産業(株)】

## ～学校向け見学会～

6/11(火)・12(水)・13(木)・14(金)・17(月)に生徒のみなさん、先生方向けの見学会を行いました。1階の東階段下から入って、1階→2階→3階→3階西渡り廊下から管理棟へ、という見学ルートでした。20分という短い時間でゆっくり見学できなかったかと思いますが、よろしければ参加されたみなさんの感想を伺いたいです。下のQRコードからWEBを開いていただくとコメント覧がありますので、感想を送信をお願いします。



## ～Brothers～

現場では親子や兄弟で働かれている方がたくさんいらっしゃいます。今回は3組の兄弟を紹介します。兄弟だからこそ、良い面もあれば、悪い面もあると思うのですが、3組の兄弟とも現場では連携プレーで良い仕事をされています。



東洋シャッター(株) 右：嶋村祐一さん(兄)  
左：嶋村和義さん(弟)



(株)富永工務店 右：野田秀光さん(兄)  
左：野田茂さん(弟)



三幸内装【出田実業(株)】 奥：三浦幸一郎さん(兄)  
手前：三浦健太郎さん(弟)

※裏の～屋上防水工事～に載せている写真の中にも兄弟がいます！

## ～所長より～

7月から本格的に仕上工事に入り、1日60名ほどの作業員さんが現場内で作業をしています。雨天が多いため、外部はブルーシートを張って作業をしています。暑い日が続きますので、熱中症の予防を図り、事故が発生しないよう十分注意し、竣工に向けて工事を進めて参ります。もうすぐ夏休みですね。勉強・部活その他いろいろな予定があると思いますが、充実した夏休みにしてください。

WEB版は右のQRコードから  
ご意見・ご要望・ご感想等はこちらからどうぞ！

